PARCO DELLA SALINELLA MARSALA_

3 TAVOLA DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

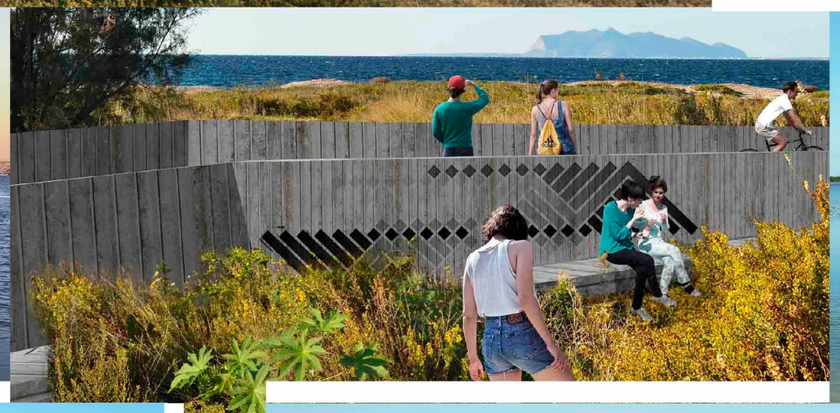

TIMELINE DEL PROGETTO

2017 — 2018 — 2019 — 2020

g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d

- Incarico/progetto definitivo-esecutivo/ Programma azioni partecipate/Creazione gruppo di lavoro in-situ (mediatori e progettisti) gara d'appalto/Caratterizzazione suoli per la bonifica/ Creazione di un'associazione locale per la gestione condivisa del parco
- Recinzione aree cantiere/ Chiusura definitiva al passaggio automezzi privati/Interventi di bonifica e pulizia/
- Rimozione cordoli e muretti preesistenti/recupero e stoccaggio per riutilizzo nelle opere a farsi lato fascia attrezzata/ Cancellazione percorsi in terra battuta/
- bando per la gestione in concessione dei servizi e delle attività
- Cantiere aperto. Integrazione botanica invito all'opera per i cittadini,primo workshop di autocostruzione arredi e giochi nel parco
- Apertura prima sezione del parco, la fascia litoranea e punta alga
- Apertura seconda sezione del parco, attrezzature pubbliche e ciclabile lungo via Vito Falco
- Costruzione del walkway in legno
- Cantiere aperto. Integrazione botanica invito all'opera per i cittadini, secondo workshop di autocostruzione arredi e giochi nel parco
- Apertura definitiva parco
- Cantiere aperto. Ultimo workshop di autocostruzione arredi e giochi nel parco. Grande festa!
- Cantiere aperto. Integrazione botanica invito all'opera per i cittadini, terzo workshop di autocostruzione arredi e giochi nel parco
